

新規恒久施設等の整備(平成31年1月時点)について

平成31年1月31日
オリンピック・パラリンピック
及びラグビーワールドカップ
推進対策特別委員会
(単位:億円)

1 新規恒久施設等の整備費

	施設名※1	当初整備費 (平成26年11月時点)	整備費の見込み		当初整備費 からの縮減額	当初整備費からの主な縮減項目等※2
			平成29年11月時点	平成31年1月時点※2		
(1)	東京アクアティクスセンター	683	567	567	▲116	・建物規模の縮小、減築の取り止め ・地中障害物や汚染土の処理
(2)	海の森水上競技場	491	308	308	▲183	・グラウンドスタンド棟などの建物の低廉化、外構の変更
(3)	有明アリーナ	404	357	<u>370</u>	▲34	・軟弱地盤対策工法の見直しや内外装、設備仕様の見直し ・アクセシビリティの強化や消防指導への対応等
(4)	カヌー・スラロームセンター	73	73	73	0	
(5)	大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場	48	48	48	0	
(6)	夢の島公園アーチェリー場	24	14	<u>9</u>	▲15	・盛土工事の進捗、施設計画の具体化を反映 ・工事入札による減を反映
(7)	有明テニスの森公園テニス施設	144	110	<u>102</u>	▲42	・競技団体等との調整結果や設計の精査を反映 ・工事入札による減、地中障害物の処理、 受注者の経営破たんに伴う増を反映
(8)	武蔵野の森総合スポーツプラザ	351	351	351	0	
(9)	その他(競技会場周辺の歩道橋等)	23	0	0	▲23	・代々木会場付近の歩道橋を大会時に仮設の横断歩道で対応
合計		2,241	1,828	<u>1,828</u>	▲413	

※1 施設名は、条例名称を表記
※2 下線は、平成29年11月時点からの変更部分

2 新規恒久施設等の整備状況

	施設名 ※1	スケジュール						備考 ※2
		27(2015) 年度	28(2016) 年度	29(2017) 年度	30(2018) 年度	31(2019) 年度	32(2020) 年度	
(1)	東京アクアティクスセンター	基本設計委託	実施設計・工事					設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成32年2月)
(2)	海の森水上競技場	基本設計委託	実施設計・工事					設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成31年5月)
(3)	有明アリーナ	基本設計委託	実施設計・工事					設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成31年12月)
(4)	カヌー・スラロームセンター	基本設計委託	実施設計委託	競技コース工事		管理棟工事		競技コース工事 (平成29年6月～平成31年5月) 管理棟工事 (平成31年1月～平成31年12月)
(5)	大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場	基本設計委託	実施設計委託	工事				工事 (平成29年12月～平成31年6月)
(6)	夢の島公園アーチェリー場	盛土設計委託	盛土工事	施設設計委託	施設工事			施設工事 (平成30年7月～平成31年2月)
(7)	有明テニスの森公園テニス施設	基本設計委託	実施設計委託	ショーコート・屋内コート等工事		屋外コート等工事		ショーコート・屋内コート等工事 (平成29年10月～平成31年7月) 屋外コート等工事 (平成31年1月～平成32年3月)
(8)	武蔵野の森総合スポーツプラザ	工事						平成29年3月竣工 平成29年11月25日開業

※1 施設名は、条例名称を表記

※2 下線は、平成30年6月時点からの変更部分



全景(南東側から)



外観(南西側から)



メインプール




サブプール

(2) 海の森水上競技場



全景(東側から)

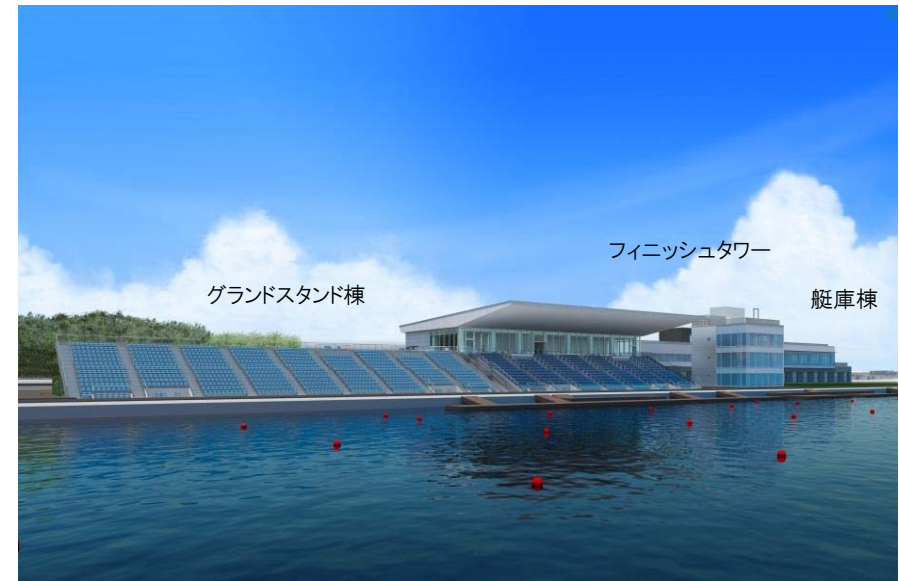

外観(南側から)



外観(東側から)



艇庫棟(西側から)

(3) 有明アリーナ



全景(北東側から)



外観(南東側から)



メインアリーナ



コンコース

現時点のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

(4)カヌー・スラロームセンター



全景(北東側から)

平成28年5月時点の大会時のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

(5)大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場




メインスタンド棟(南西側から)



メインスタンド棟(北東側から)

(6) 夢の島公園アーチェリー場

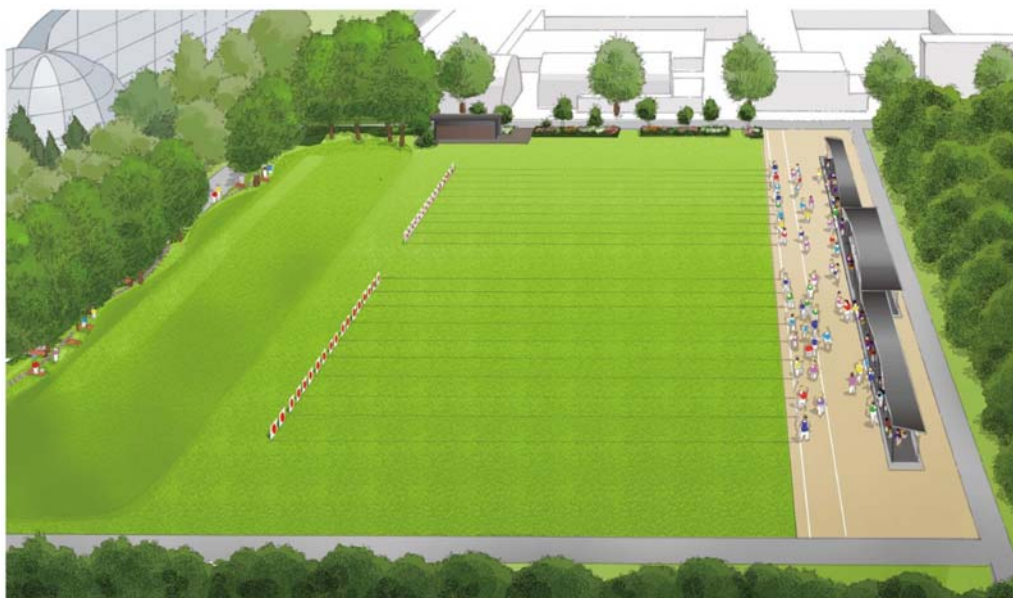

全景(西側から)



日よけ屋根(北西側から)

(7) 有明テニスの森公園テニス施設



全景(南側から)



ショーコート(南西側から)



クラブハウス・インドアコート(南東側から)



インドアコート

新規恒久施設等の工事状況(平成30年12月末時点)



(1) 東京アクアティクスセンター



(2) 海の森水上競技場



(3) 有明アリーナ



(4) カヌー・スラロームセンター

新規恒久施設等の工事状況(平成30年12月末時点)



(5)大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場



(6)夢の島公園アーチェリー場



(7)有明テニスの森公園テニス施設
