



# オーバーレイブック更新等業務委託（その2） の発注について

会場整備局

# 1 決議事項

・競技会場のオーバーレイブック及びコンテンツ図の更新業務を委託する。

※4/24、5/14作業部会に引き続き

# 2 背景

- ・オーバーレイブックとは、IOC、IF、各FA等からの要件を踏まえ、各FA相互間が会場の整備内容を共通認識するために作成するもの
- ・これまで6か月ごとに更新を行ってきており、各FAの技術検討や運営計画の検討、OBSのレビューなどに活用されてきた。
- ・2019年度は、大会本番を間近に控え、運営に必要な情報を最終化させ、各FA間が共有する総合図としてオーバーレイブックを更新していく。

# 各会場の発注グループ핑

灰色 : 4/24、5/14 作業部会

黄色 : 5/28 作業部会

グループ 1	1	オリンピックスタジアム	グループ 4	1	釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
	2	東京体育館	グループ 5	1	さいたまスーパーアリーナ
	3	国立代々木競技場	グループ 6	1	有明体操競技場
	4	日本武道館	グループ 7	1	富士スピードウェイ
1	海の森水上競技場	2		武蔵野の森公園	
グループ 2	2	海の森クロスカントリーコース	グループ 8	1	皇居外苑
	3	大井ホッケー競技場	グループ 9	1	国技館
	4	カヌー・スラロームセンター		2	有明アリーナ
	5	青海アーバンスポーツパーク		3	有明テニスの森
	6	お台場海浜公園		4	有明アーバンスポーツパーク
	7	潮風公園		5	横浜スタジアム
	8	陸上自衛隊朝霞訓練場		6	江の島ヨットハーバー
7	福島あづま球場	7		夢の島公園アーチェリー場	
グループ 3	1	霞ヶ関カンツリー倶楽部	グループ 10	1	武蔵野の森総合スポーツプラザ
	2	幕張メッセ Aホール		2	東京スタジアム
	3	幕張メッセ Bホール (Aに含む)		3	東京アクアティクスセンター
	4	幕張メッセ Cホール (Aに含む)	グループ 11	1	東京辰巳国際水泳場
	5	横浜国際総合競技場		2	
	6	茨城カシマスタジアム			
	7	埼玉スタジアム 2002			
	8	札幌ドーム			
	9	宮城スタジアム			

※グループ 7 については、2018年度OB更新等契約を7月末まで工期変更しているため、それ以降で発注予定。

※国際フォーラム、馬事公苑、伊豆ベロドロームのOB更新等については、工事監理等業務に含む。

【参考：4/24作業部会資料】

# 3 業務の内容について

## (1) 件名

「オーバーレイブック更新等業務委託（その2）」（仮称）

## (2) 業務概要

- ① オーバーレイブック更新業務
- ② コンテインメント図（各FAの設備配管図）  
の更新業務 など

# 4 仮設オーバーレイの全体計画①


	～2017年	2018年		2019年	2019年	2020年
		3月	9月	3月	9月	3月
Ver	～OB2.1	OB3.0	OB3.1	OB4.0	OB4.1	OB5.0
事業進捗			入札手続き・交渉			
		基本設計		実施設計・整備		
OB図作成		オーバーレイブック更新等業務①		オーバーレイブック更新等業務②		
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>大会要件を踏まえたブロックプラン（基本計画）</li> <li>予算算出に活用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本設計の成果を図面化</li> <li>発注金額の算出に活用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各F A要望の精緻化に伴う修正など</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実施設計の一部を反映</li> <li>コスト削減に伴う変更内容を反映</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コスト最適化を踏まえた実施設計の成果を反映</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>オーバーレイブックの最終化</li> </ul>

## 4 仮設オーバーレイの全体計画②


	2019年9月頃	2020年3月頃
Ver	OB4.1	OB5.0
内容	コスト最適化を踏まえた実施設計の成果を反映	施工着手前の最終調整を反映
具体例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計の成果に応じた仮設物の配置</li> <li>・ブロードキャストコンパウンドの詳細化（ライツホルダーキャビンなどの規模・配置など）</li> <li>・観客席におけるコメンタリーポジションなど関係者席の確定など</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各与条件（OBS、IF、VOP、VUAなど）の最終化に伴う図面修正</li> <li>・最終版はナレッジとしての資料としても活用（IOCからの要望）</li> </ul>

# 5 オーバーレイブック更新イメージ (2019.3⇒2020.3)

〈V4.0相当：過去大会会場〉

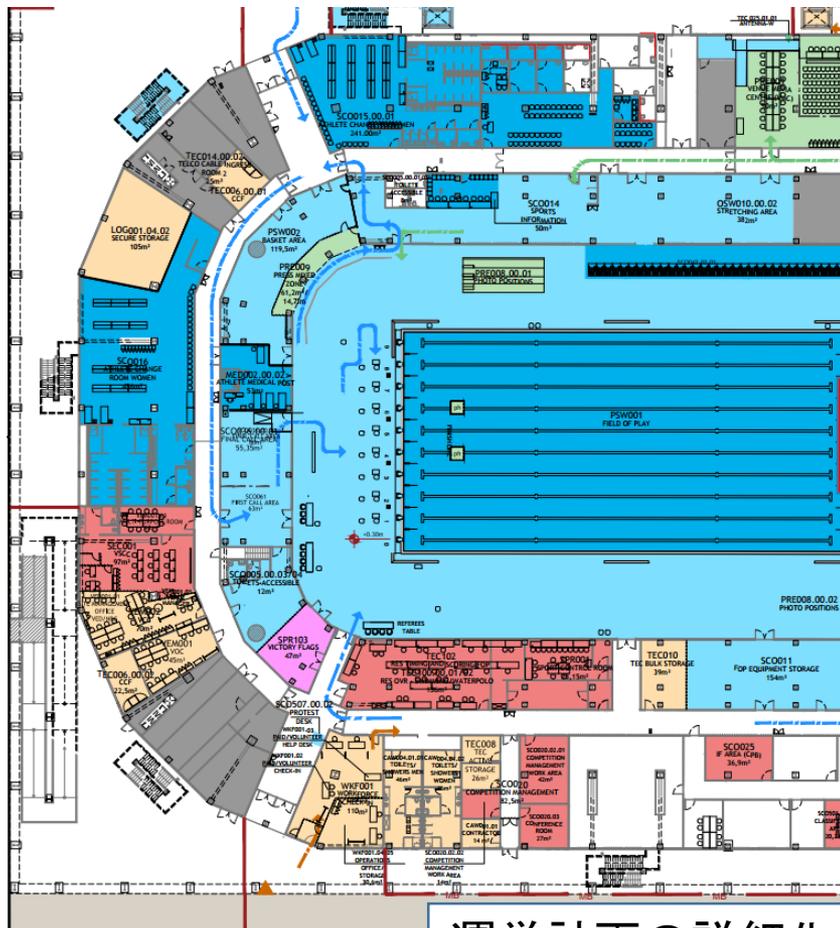

〈V5.0相当：過去大会会場〉


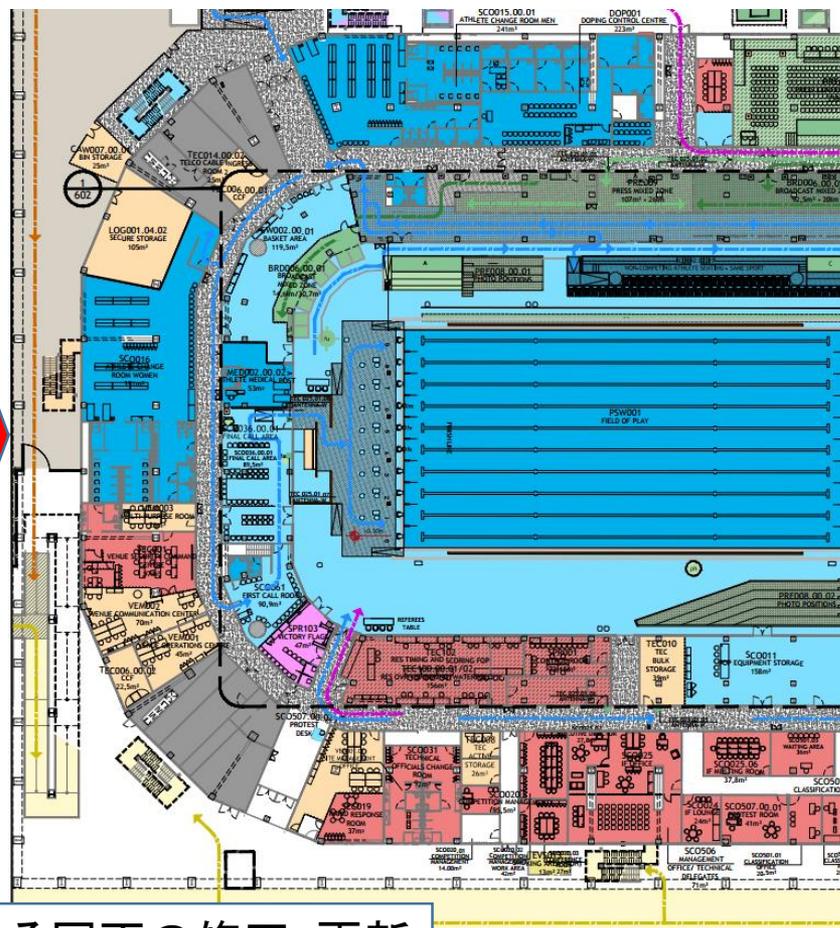


運営計画の詳細化による図面の修正・更新


# 6 コンテインメント図

海外ステークホルダーやOBSがケーブル敷設する配線ルートや仕様について組織委員会と協議するための資料

今後、OBSのレビューに応じて修正、更新が必要

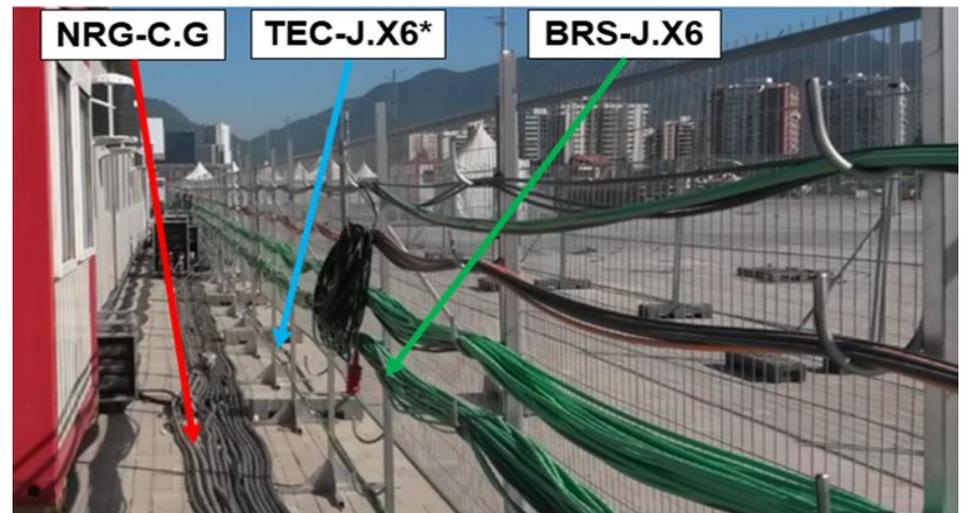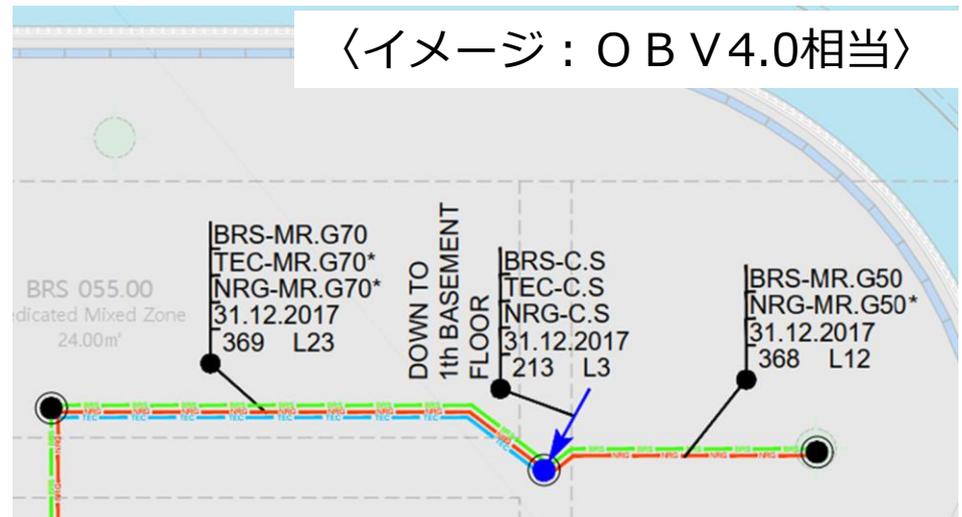

# 7 業務イメージ

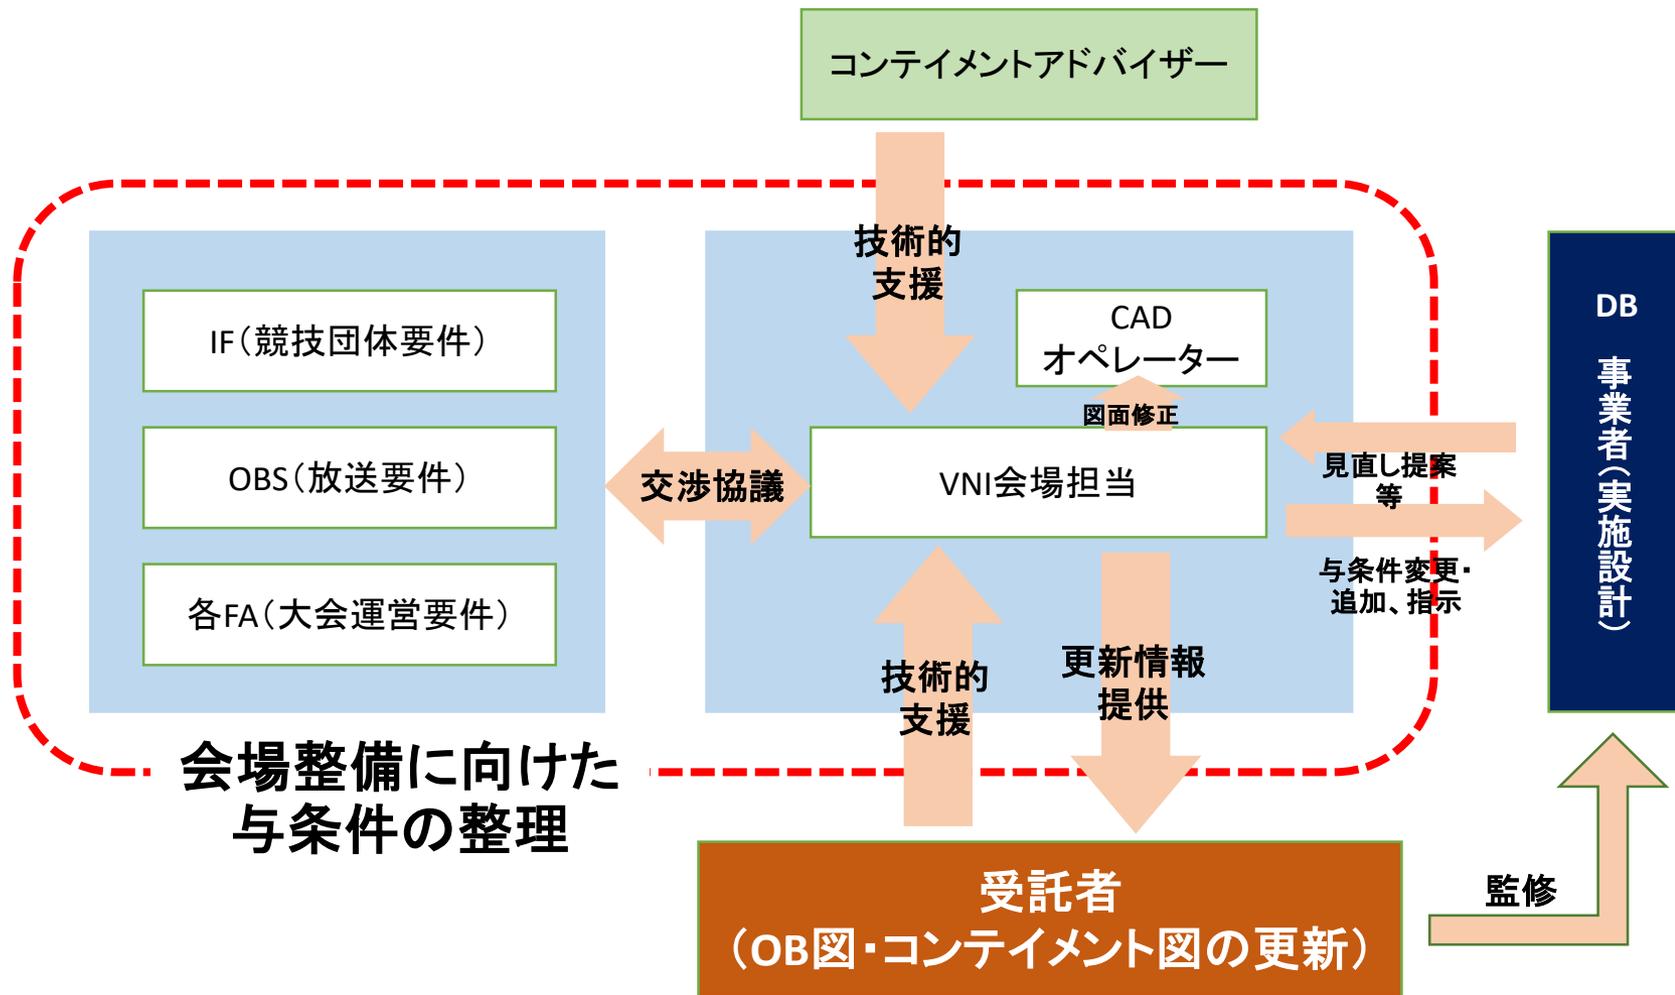

## 8 発注概要

(1) 予定調達方式 (調達管理委員会付議案件)

特別契約 (原則、基本設計を受託した設計事務所)

(2) 予定金額 (V3予算の範囲内)

国交省の定める標準単価により積算

(3) 予定契約期間

2019年5月～2020年3月末
